

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2007 ROKU

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów

Suma osiągniętych w I półroczu 2007 roku dochodów wyniosła 89.157.151,78 zł, co stanowi 44% planu. Po wyłączeniu z planowanych kwot środków unijnych (realizacja bardzo niska) wykonanie stanowiłoby 58% planu.

Realizacja dochodów za I półrocze 2006 wynosiła 63.454.747,00 zł co stanowiło 34% zaplanowanej kwoty (po wyłączeniu środków ZPORR, SPOT i wpływów z jednostki budżetowej ZBM z planu realizacja wynosiłaby 48,4%).

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały na poziomie 70%. W głównej mierze wpływ na taką sytuację miały przywrócone dochody z tytułu wydatków niewygasających, których termin realizacji minął, wyższe od planowanych odsetki od środków na rachunkach bankowych, ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wyższe niż 50% wykonanie w poszczególnych pozycjach grupy podatki i opłaty lokalne.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło 9.150.866,61 zł, jest to 53% planowanej kwoty. Na półrocze 2006 wykonanie wyniosło 8.792.840,00 zł. co stanowiło 52,3% planu.

W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań, podatnicy regulują na bieżąco zobowiązania wobec budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 276.510,81 zł. (2006 rok – 281.073,39 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 126.460,00 zł., dotyczy to zwolnienia jednostek i zakładów budżetowych, (w 2006 roku była to kwota 181.278,00 zł., ponieważ występowało również zwolnienie Parku Przemysłowego w ramach pomocy de minimis). Zaległości wyniosły 6.015.298,86 zł, z czego z majątku miasta to kwota prawie 2.350 tys.zł.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 242.101,10 zł., natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 513.142,00 zł.

Na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne – wystawiane są tytuły wykonawcze, dokonywane są również wpisy hipoteczne w celu zabezpieczenia należności budżetu miasta.

Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów w grupie podatków i opłat lokalnych nie budzi zastrzeżeń. Niższe wpływy w porównaniu do półrocza 2006 dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej (w związku ze zmianą przepisów).

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na kwotę 6.567.831,01 zł. co stanowi 69% planu. Za 6 miesięcy roku 2006 wykonanie to wyniosło 3.413.128,00 zł i stanowiło 57% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2007	Os.prawne	6,71%	1,40%
	Os.fizyczne	36,22%	10,25%
2006	Os.prawne	6,71%	1,40%
	Os.fizyczne	35,95%	10,25%

Porównanie kwoty udziałów, subwencji oraz dotacji celowych przedstawia się następująco:


Rok		udziały	subwencje	dotacje	razem
2007	Gmina	16.596.634,93	13.717.282,00	5.767.761,98	
	Powiat	4.656.605,13	12.124.246,00	2.080.659,00	
	<i>SUMA</i>	<i>21.253.240,06</i>	<i>25.841.528,00</i>	<i>7.848.420,98</i>	54.943.189,04
2006	Gmina	11.852.580,00	12.909.624,00	5.345.384,00	
	Powiat	3.344.954,00	11.417.662,00	2.026.005,00	
	<i>SUMA</i>	<i>15.197.534,00</i>	<i>24.327.286,00</i>	<i>7.371.389,00</i>	48.896.209,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 4.760.780,94 zł. Co stanowi 45% planu, w tym 4.638.291,00 to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (wydatki wyniosły 4.592.739,73 zł.). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 2.079.059,00 zł. tj. 50% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 1.863.070,43 zł.

Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2006 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 1,5 mln. wyższa.

Najwyższy wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwotowo to ponad 6 mln. zł., zaś w porównaniu do półrocza 2006 to wzrost o prawie 40%.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych grupach w tys.zł. przedstawia się następująco

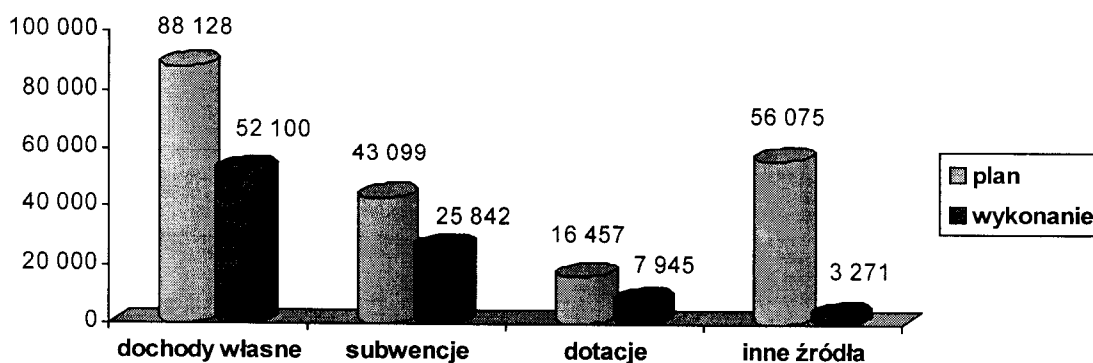

2. Realizacja wydatków


Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2007 roku wyniosły 69.253.243,68 zł., stanowi to 29,8% planowanej kwoty. Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące, w tym:
 - na zadania własne 52.562.910,33 zł.
 - na zadania zlecone gminie 4.592.739,73 zł.
 - na zadania zlecone powiatowi 1.863.070,43 zł.
- wydatki inwestycyjne, w tym:
 - na zadania własne 10.234.523,19 zł.

Wydatki za I półrocze 2006 roku ukształtowały się na poziomie 60.659.875,00 zł. co stanowiło 27,4% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 46,7% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 9,6%.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

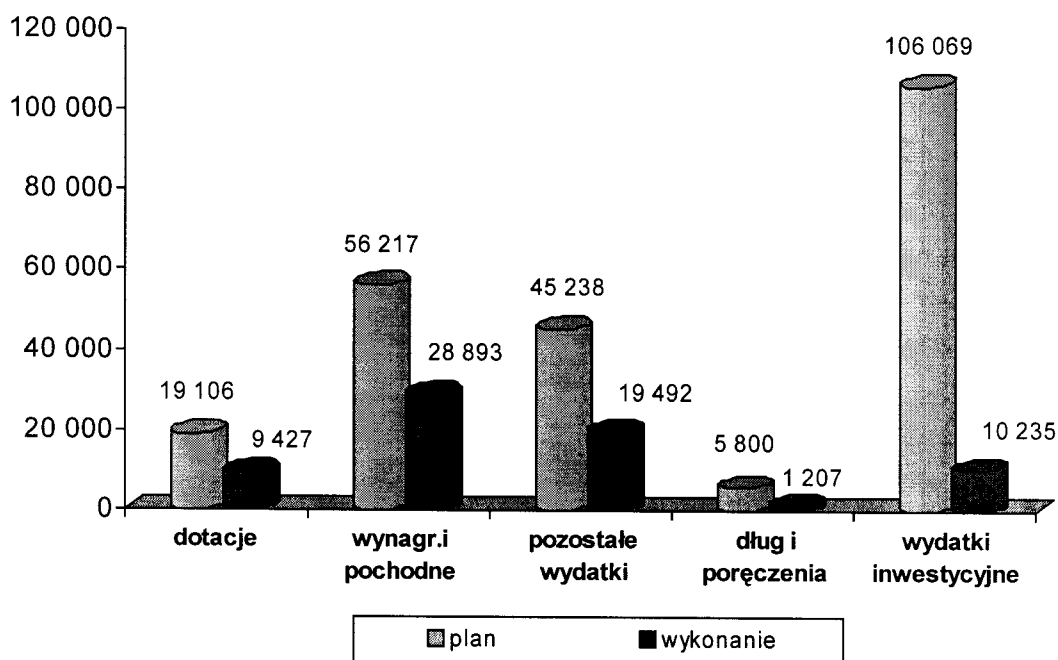

Największe różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2007 i 2006 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – niższe wydatki bieżące ze względu na niewielką akcję zima (spadek o ok. 500 tys. zł.),
- 2) gospodarka mieszkaniowa – ujęcie pełnych wydatków jednostki budżetowej ZBM (na półrocze 2006 zakład budżetowy) – wzrost o 3,3 mln. zł.
- 3) oświata i wychowanie – wydatki są o 1,2 mln. zł. wyższe niż w 2006 roku, związane to jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,
- 4) pomoc społeczna – realizacja wypłat świadczeń rodzinnych (wzrost o ponad 650 tys. zł.),
- 5) obsługa długu publicznego – wykonanie wyższe o ok. 200 tys. zł. w związku z tym, że wzrosły stopy procentowe na rynku międzybankowym.

3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki inwestycyjne na koniec czerwca 2007 roku wyniosły 10.234.523,19 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zdania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego. Dodatkowo sporządzony został aktualny załącznik z terminami wszczęcia postępowania przetargowego, otwarcia ofert, rozpoczęcia i zakończenia robót oraz odbioru końcowego.

4. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2007 roku ukształtowała się na poziomie +19.903.908,10 zł. W analogicznym okresie 2006 roku była to kwota +2.794.871,79zł. Czyli wystąpiła nadwyżka.

W I półroczu 2007 roku zaciągnięty został kredyt w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do 9 mln zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 rok. Wykorzystanie tego kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca zadłużenie z tego tytułu oraz koszty odsetek nie wystąpiły (zgodnie ze złożoną przez ING Bank Śląski ofertą nie jest pobierana prowizja od uruchomionego kredytu, a marża wynosi 0%).

W trakcie pierwszych 6 miesięcy roku miasto zaciągnęło pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne

- na drogach wojewódzkich w kwocie 3.119.432,11 zł, koszty opłat i prowizji 469,00 zł;
- na DK-81 w kwocie 195.055,45 zł, opłaty i prowizje wyniosły 400,00 zł.

Spląty kredytów przedstawiają się następująco:

<i>Bank</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Kwota splat</i>	<i>Kwota odsetek</i>
Nordea Bank Polska	Deficyt 2003	2.100.000,00	247.330,57
Kommunalkredit	Deficyt 2004	1.200.000,00	199.505,56
PKO BP	Deficyt 2005	300.000,00	83.546,72
ING Bank Śląski	Deficyt 2005	1.200.000,00	272.294,56
ING Bank Śląski	Deficyt 2006	600.000,00	208.078,86
ING Bank Śląski	Deficyt 2006	0,00	196.020,52
ING Bank Śląski	Rachunek bieżący	-	0,00
	RAZEM	5.400.000,00	1.206.776,79
BGK Warszawa	Pożyczka na prefinansowanie DW-932 i DW-935	3.196.096,81	15.130,06
BGK Warszawa	Pożyczka na prefinansowanie DK-81	0,00	6.662,53
	OGÓŁEM	8.596.096,81	1.228.569,38

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły 9.824.666,19 zł., co stanowi 4,82% planowanych dochodów.

Dług na 30 czerwca 2007 wyniósł 54.399.460,42zł (w tym pożyczki na prefinansowanie 2.174.288,42 zł), co stanowi 26,7% planowanych dochodów (zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych dochodów).

Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych pożyczka na prefinansowanie na realizację zadania ze środków ZPORR (drogi wojewódzkie) oraz SPOT (droga krajowa 81) podlega wyłączeniu z obliczanych wskaźników. Zgodnie z tym zadłużenie na koniec czerwca 2007 roku wyniosło 52.225.172,00 zł, co w odniesieniu do planowanych dochodów stanowi 25,6%.

Spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, po wyłączeniu prefinansowania, wyniosły 6.606.776,79 zł, czyli 3,24% planowanych dochodów.

5. Zakłady budżetowe

Suma przychodów zakładów budżetowych wyniosła 8.860.041,87 zł, stanowi to 50,8% planu, w tym dotacje z budżetu 5.678.340,07 zł (49,3% planu). Rozchody ogółem wyniosły 9.350.552,33 zł. i jest to 53,5% planowanej kwoty, w tym wydatki inwestycyjne 605.452,25 zł. (39,8% planu).

W I półroczu 2006 przychody ogółem wyniosły 12.518.826,00 zł., co stanowiło 51,6% planu, w tym dotacje z budżetu 6.298.494,00 zł (40,4% planu). Wydatki bieżące to kwota 12.035.214,00 zł., zaś wydatki inwestycyjne 445.997,00 zł.

Wyższe kwoty ogółem spowodowane były istnieniem w I półroczu 2006 roku zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Miejskich (obecnie jednostka budżetowa).

6. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane obejmują dochody gromadzone na podstawie Uchwały Rady Miasta oraz dochody pochodzące z darowizn.

Planowana kwota dochodów własnych wynosi 1.623.321,00 zł., zrealizowano 766.816,08 zł. (47,2% planu). Wydatki poniesione zostały w kwocie 807.806,18 zł., co stanowi 40,9% planu.

W kwocie wydatków ogółem zaplanowano 124.490,00 zł wydatków inwestycyjnych, w tym:

- Zespół Szkół nr 1 - 4.000,00 zł
- Zespół Szkół nr 2 – 14.990,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych – 14.000,00 zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 91.500,00 zł.

Wydatki w powyższym zakresie zrealizowały 2 jednostki:

- Zespół Szkół nr 2 – 14.903,52 zł. (klimatyzacja)
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 43.189,94 zł. (m.in.: komputer, kratki przelewowe oraz maty antybakteryjne na basen kryty, bieżnia na halę sportową).

Za I półrocze 2006 planowana kwota dochodów własnych wynosiła 1.554.460,00 zł., zrealizowano 829.528,54 zł., co stanowiło 53,4%. Poniesione wydatki wyniosły 769.296,53 zł., czyli 41,7% planu.

7. Fundusze celowe

- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Wykonane przychody to kwota ponad 282 tys. zł. (64,8% planu), poniesione koszty to ponad 134 tys. zł (17,2% planu). Dokonane wydatki dotyczyły aktualizacji programu EGBV, archiwizacji cyfrowej danych zasobu geodezyjnego, zakupu sprzętu komputerowego oraz rozbudowy internetowego planu miasta. Pozostało do dyspozycji około 650 tys. zł.

- Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wpływy zostały zrealizowane na kwotę ponad 84 tys. zł (46,5% planu). Wydatki wyniosły ponad 174 tys. zł (41,3%). Wydatkowano środki na edukację ekologiczną, monitoring środowiska, zadania modernizacyjne, ochronę wód, gospodarkę odpadami, likwidację awarii ekologicznych, profilaktykę zdrowotną oraz usuwanie materiałów zawierających azbest. Stan funduszu na 30.06.2007 r. wyniósł ponad 153 tys. zł.

8. Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 190.599,00 zł. Na 30 czerwca 2007 roku wydatki wykonane wyniosły 82.940,70 zł., czyli 43,5% planu. Do wykorzystania pozostało 107.658,30 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.

9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory

Wydatki w I półroczu 2007 wyniosły 4.343.406,77 zł., uzyskane dochody to kwota 3.196.096,81 zł. W całym okresie realizacji projektu, czyli od roku 2004 do 30.06.2007 r., wydatki ogółem wyniosły 22.069.330,24 zł., zaś dochody 13.318.745,60 zł.

I etap: pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową w dniu 27.07.2005 r. z firmą BUREAU Veritas Sp. z o.o.

II etap: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (Al. Zjednoczonej Europy, Al. Armii Ludowej, Al. Armii Krajowej - I etap) został zakończony w dniu 04.10.2006 r.

W ramach realizacji III etapu: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (Al. Armii Krajowej II etap, budowa wiaduktu w ciągu ul. Wodzisławskiej)" został wykonany następujący zakres robót:

Rozbiórka elementów drogi: krawężniki - 4 850 m, chodniki - 540 m², frezowanie nawierzchni drogi - 16 170 m², wykopy - 3 120 m³, nasypy, - 6 910 m³, wzmocnienie podłoża -2 435 m², warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm - 6 650 m², podbudowa z kruszywa naturalnego - 17 250 m², - warstwa mineralna -

asfaltowa 650 t oraz wyrównawcza – 2510 t, warstwa wiążąca – 2 340 t, kanalizacja deszczowa – 1 150 mb w tym 611 m przykanalików, wiadukt drogowy szt. 1 – 90% wykonanych robót, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Folwarczką – jeszcze tylko nie został zabudowany sterownik, oświetlenie uliczne – 114 punktów świetlnych,

W ramach realizacji IV etapu: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 932 (ul. Wodzisławska)" w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20.12.2006 r. przetarg w dniu 12.02.2007 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty:

1. Budimex Dromex S.A. Warszawa, **(23.688.216,68 zł.)**,
2. Konsorcjum firm:* Zakład Wielobranżowy „Kryza-Plast” Mikołów-Mokre * Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Katowice, **(21.119.168,66 zł.)**,
3. „Hydrobudowa Śląsk” S.A .Katowice, „Hydrobudowa Włocławek S.A.” Przeźmierowo, Wysogotowo k/Poznania **(28.298.092,78 zł.)**.

W dniu 16.03.2007 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm:* Zakład Wielobranżowy „Kryza-Plast”* Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. na łączną kwotę **21.119.168,66 zł.**

W ramach przedmiotowego etapu zostały wykonane następujące prace:

Zdjęcie warstwy humusu – 9 850 m², rozbiórka elementów drogi: krawężniki betonowe 3 870 m, chodniki o nawierzchni asfaltowej - 5 310 m², chodniki z płytek - 890 m², obrzeża –3 700 m, frezowanie nawierzchni – 19 965 m², drenaż koryta drogi - 510 m.

V etap: pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (ul. Rybnicka)" w lipcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

VI etap pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (ul. Pszczyńska)" podobnie jak w etapie V planuje się ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

b) Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK – 81 w Żorach

Na realizację tego projektu do 30.06.2007 r. wydatkowano kwotę 2.576.185,50 zł. Ogółem wydatki od roku 2005 do półrocza 2007 wyniosły 3.822.613,17 zł. Refundacja poniesionych wydatków w części wynikającej z umowy dofinansowania do końca czerwca 2007 roku nie została dokonana, więc dochody z tego tytułu nie wystąpiły, pomimo złożenia wniosków o płatność.

W styczniu 2007 roku wykonawca robót budowlanych STRABAG Sp. z o.o. przedstawił harmonogram robót kontraktowych wraz z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Planem Zapewnienia Jakości (PZJ). Harmonogram ten został pozytywnie zaopiniowany przez Inżyniera Kontraktu (LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.) a następnie przesłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu. W czerwcu br. został ogłoszony przetarg na wykonawstwo ekranów akustycznych. Ponadto w ramach realizacji robót budowlanych zostały wykonane m. in. następujące roboty:

		zaawansowanie w %
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	3,358 km	
50,00		
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 18 cm	9 758 m ²	19,70
Budowa sieci rurociągów drenarskich	608 m	
19,20		
Nawierzchnia z betonu B 40	27 151 m ²	25,80
Frezowanie powierzchniowe	18 374 m ²	18,00

Kanalizacja deszczowa	0,5 kpl	
50,00		
Budowa przepustów pod koroną drogi	0,3 kpl	
30,00		
Roboty elektryczne	0,37 kpl	37,00

Narastająco od początku realizacji wartość zafakturowanych robót łącznie wyniosła 6 052 202,52 PLN, co stanowi 14,58 % wartości Kontraktu. W rzeczywistości postęp prac jest dużo większy. Np. nie zostały jeszcze zafakturowane prace związane z wykonaniem nawierzchni betonowej.

c) W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach

Wydatki na realizację tego projektu będą ponoszone od 2008 do 2010 roku, kwota ogółem wynosi 3.829.800,00 zł. (zadania inwestycyjne i bieżące), w tym dofinansowanie 3.255.330,00 zł.

d) Scena na Starówce w Żorach – rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej

Zaplanowane na ten cel wydatki wynoszą 8.472.236,80 zł. Zgodnie z zawartą umową w dniu 11 czerwca 2007 r., dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do ww. projektu wyniesie 4.629.177,60 zł. Zadanie będzie realizowane w 2007 i 2008 roku.

e) Wygraj szansę – program stypendialny Miasta Żory dla studentów

W 2007 roku wpłynęło 25.364,76 zł. na realizację tego projektu, w tym 20.171,88 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5.192,88 zł. z budżetu państwa. Do końca czerwca 2007 roku wydatkowano 30.000,00 zł, w tym z EFS 20.171,88 zł., 5.192,88 zł. z budżetu państwa i 4.635,24 zł. z budżetu miasta jako wkład własny. W całym okresie realizacji (lata 2006-2007) otrzymane dochody wyniosły 63.411,90 zł., natomiast dokonano wydatków na kwotę 75.000,00 zł.

f) Bilet do kariery – program stypendialny Miasta Żory dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W I półroczu 2007 dochody zostały zrealizowane w kwocie 76.685,00 zł., w tym 52.183,83 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego i 24.501,17 zł. z budżetu państwa. Do końca czerwca 2007 roku dokonano wydatków na kwotę 65.585,00 zł., w tym 44.629,84 zł. z EFS i 20.955,16 zł. z budżetu państwa. Od początku realizacji tego projektu, czyli od 2006 roku, do końca czerwca 2007 roku miasto uzyskało dochody w kwocie 109.550,00 zł. i dokonało wydatków na kwotę 98.450,00 zł.

g) Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Projekt będzie realizowany do 2011 roku, ogółem wydatki wyniosą 80.800,00 zł., z czego dofinansowanie to kwota 68.670,00 zł.

h) Inkubator Organizacji Pozarządowych

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2007 roku i zakończy się w roku 2008. Wydatki na ten cel wynoszą łącznie 290.100,00 zł. (w 2007 roku – 194.400,00 zł.)

i są w całości refundowane ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

- informację z wykonania dochodów (według źródeł i działów klasyfikacji);
- informację z wykonania wydatków (w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków);
- zestawienie planów finansowych placówek oświatowych;
- informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego;
- informację o realizacji planu finansowego zakładów budżetowych;
- zestawienie przychodów i kosztów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- zestawienie przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- informację o realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych;
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy;
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy;
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku,
- wyszczególnienie dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów,
- załącznik o realizacji zadań inwestycyjnych z terminami wszczęcia postępowania przetargowego, otwarcia ofert, rozpoczęcia i zakończenia robót oraz odbioru końcowego.

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar S.
